作業日報

御確認印	作成者印

作業日時	平成 26 年 7 月 22 日（火） 8：30 ～ 17：30（8 時間） 第 11 日目		
作業場所	高エネルギー加速器研究機構 殿		
件　　名	DR輸送路電磁石設置 一式		
請負業者	（株）日立テクノロジーアンドサービス	責任者	電話番号
作業番号	CG2915	山下 秀昭	029-852-7735
作業員名	（株）日立テクノロジーアンドサービス：小森 博導（1名） 山九プラントテクノ（株）：中尾 憲司、細谷 和史、鈴木 正樹（3名） 館野電気工事（株）：吉田 健次、小林 淑人、板橋 智之、宇賀神 善徳 館野 佳克、加藤 好洋、後藤 勇、鳥取 純基、渡辺 洋治（9名） （株）茨城特殊工業：藤沢 聖悟、櫻井 崇也、鈴木 昇、松崎 翼（4名） 作業者数：　17　名		
作業内容	【電気】 1．ケーブルラック、サポート加工 2．ケーブルラックサポート取付 【機械】 1．電磁石架台アンカー位置コア抜き（20 箇所：φ24mm×深300mm） 2．モニタ類架台中心位置ケガキ（50箇所：フェンス、グレーチング部を除き完了） 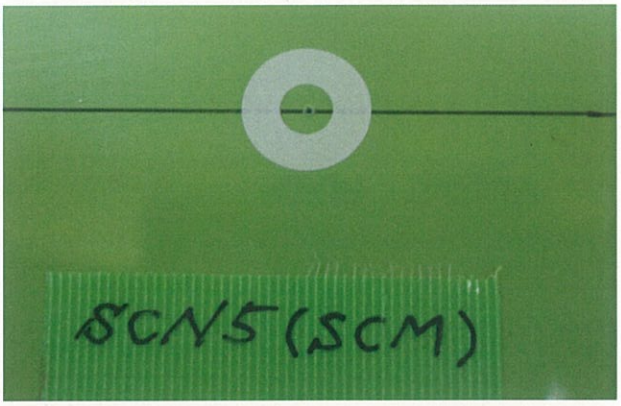 		
特記事項 （問題点）	1．本日罫書いたモニタ類架台中心位置の確認をお願いします。 2．電磁石の約20mm嵩上げと、グレーチングに乗る電磁石のベースプレートを別途提案しますので、ご検討とご指示をお願いします。		
明日の作業	【電気】1．ケーブルラックサポート加工、取付 2．ケーブルラックサポートアンカー打設 【機械】1．電磁石架台アンカー位置コア抜き		
